Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger
1	**Fernwärme Bremen**	**Die 09.11.21**	**Die 14.11.23**	**526 Tage?**	
2	**Los 1 bis Los 4**	**Die 09.11.21**	**Die 09.11.21**	1 Tag?	
3	**Vorbereitende Arbeiten (Materialbestellung und BE)**	**Die 09.11.21**	**Die 04.01.22**	**41 Tage?**	
4	**1. Hochschulring**	**Mit 05.01.22**	**Die 03.05.22**	**85 Tage**	
5	U1.1	Mit 05.01.22	Die 15.02.22	30 Tage	3
6	U1.2	Mit 16.02.22	Die 03.05.22	55 Tage	5
7	**2. Kuhgrabenweg**	**Mit 05.01.22**	**Die 11.10.22**	**200 Tage**	
8	U2.1	Mit 05.01.22	Die 15.02.22	30 Tage	3
9	U2.2	Mit 16.02.22	Die 11.10.22	170 Tage	8
10	**3. Kanalbrücke / Parkallee / Zur Munte**	**Mon 11.04.22**	**Fre 16.09.22**	**115 Tage**	
11	U3.1	Mon 22.08.22	Fre 16.09.22	20 Tage	12
12	U3.2	Mon 01.08.22	Fre 19.08.22	15 Tage	13
13	U3.3	Mon 04.07.22	Fre 29.07.22	20 Tage	14
14	U3.4	Mon 06.06.22	Fre 01.07.22	20 Tage	15
15	U3.5	Mon 09.05.22	Fre 03.06.22	20 Tage	16
16	U3.6	Mon 11.04.22	Fre 06.05.22	20 Tage	6EA-17 Tage
17	**4. Ahornweg**	**Die 01.11.22**	**Mon 20.02.23**	**80 Tage**	
18	U4.0	Die 01.11.22	Mon 20.02.23	80 Tage	
19	**5. Barbara McClintock-Str.**	**Mon 04.07.22**	**Fre 02.09.22**	**45 Tage**	
20	U5.0	Mon 04.07.22	Fre 02.09.22	45 Tage	14
21	**6. Hildegard von Bingen Straße**	**Mon 05.09.22**	**Fre 30.12.22**	**85 Tage**	
22	U6.1	Mon 05.09.22	Fre 23.09.22	15 Tage	20
23	U6.2	Mon 26.09.22	Fre 28.10.22	25 Tage	22
24	U6.3	Mon 31.10.22	Fre 18.11.22	15 Tage	23
25	U6.4	Mon 21.11.22	Fre 30.12.22	30 Tage	24
26	**7. Lise-Meitner Str.**	**Mon 02.01.23**	**Fre 31.03.23**	**65 Tage**	
27	U7.0	Mon 02.01.23	Fre 31.03.23	65 Tage	25EA-5 Tage
28	**8. DB-Unterquerung**	**Fre 25.11.22**	**Don 16.02.23**	**60 Tage**	
29	U8.0	Fre 25.11.22	Don 16.02.23	60 Tage	31
30	**9. Pferdewiese**	**Mit 27.04.22**	**Don 24.11.22**	**152 Tage**	
31	U9.1	Die 04.10.22	Don 24.11.22	38 Tage	32
32	U9.2	Don 11.08.22	Mon 03.10.22	38 Tage	33
33	U9.3	Mon 20.06.22	Mit 10.08.22	38 Tage	34
34	U9.4	Mit 27.04.22	Fre 17.06.22	38 Tage	36
35	**10. Wendeschleife**	**Mit 02.03.22**	**Die 26.04.22**	**40 Tage**	
36	U10.0	Mit 02.03.22	Die 26.04.22	40 Tage	
37	**11. H.-H.-Meier-Allee**	**Mit 05.01.22**	**Don 26.10.23**	**472 Tage**	

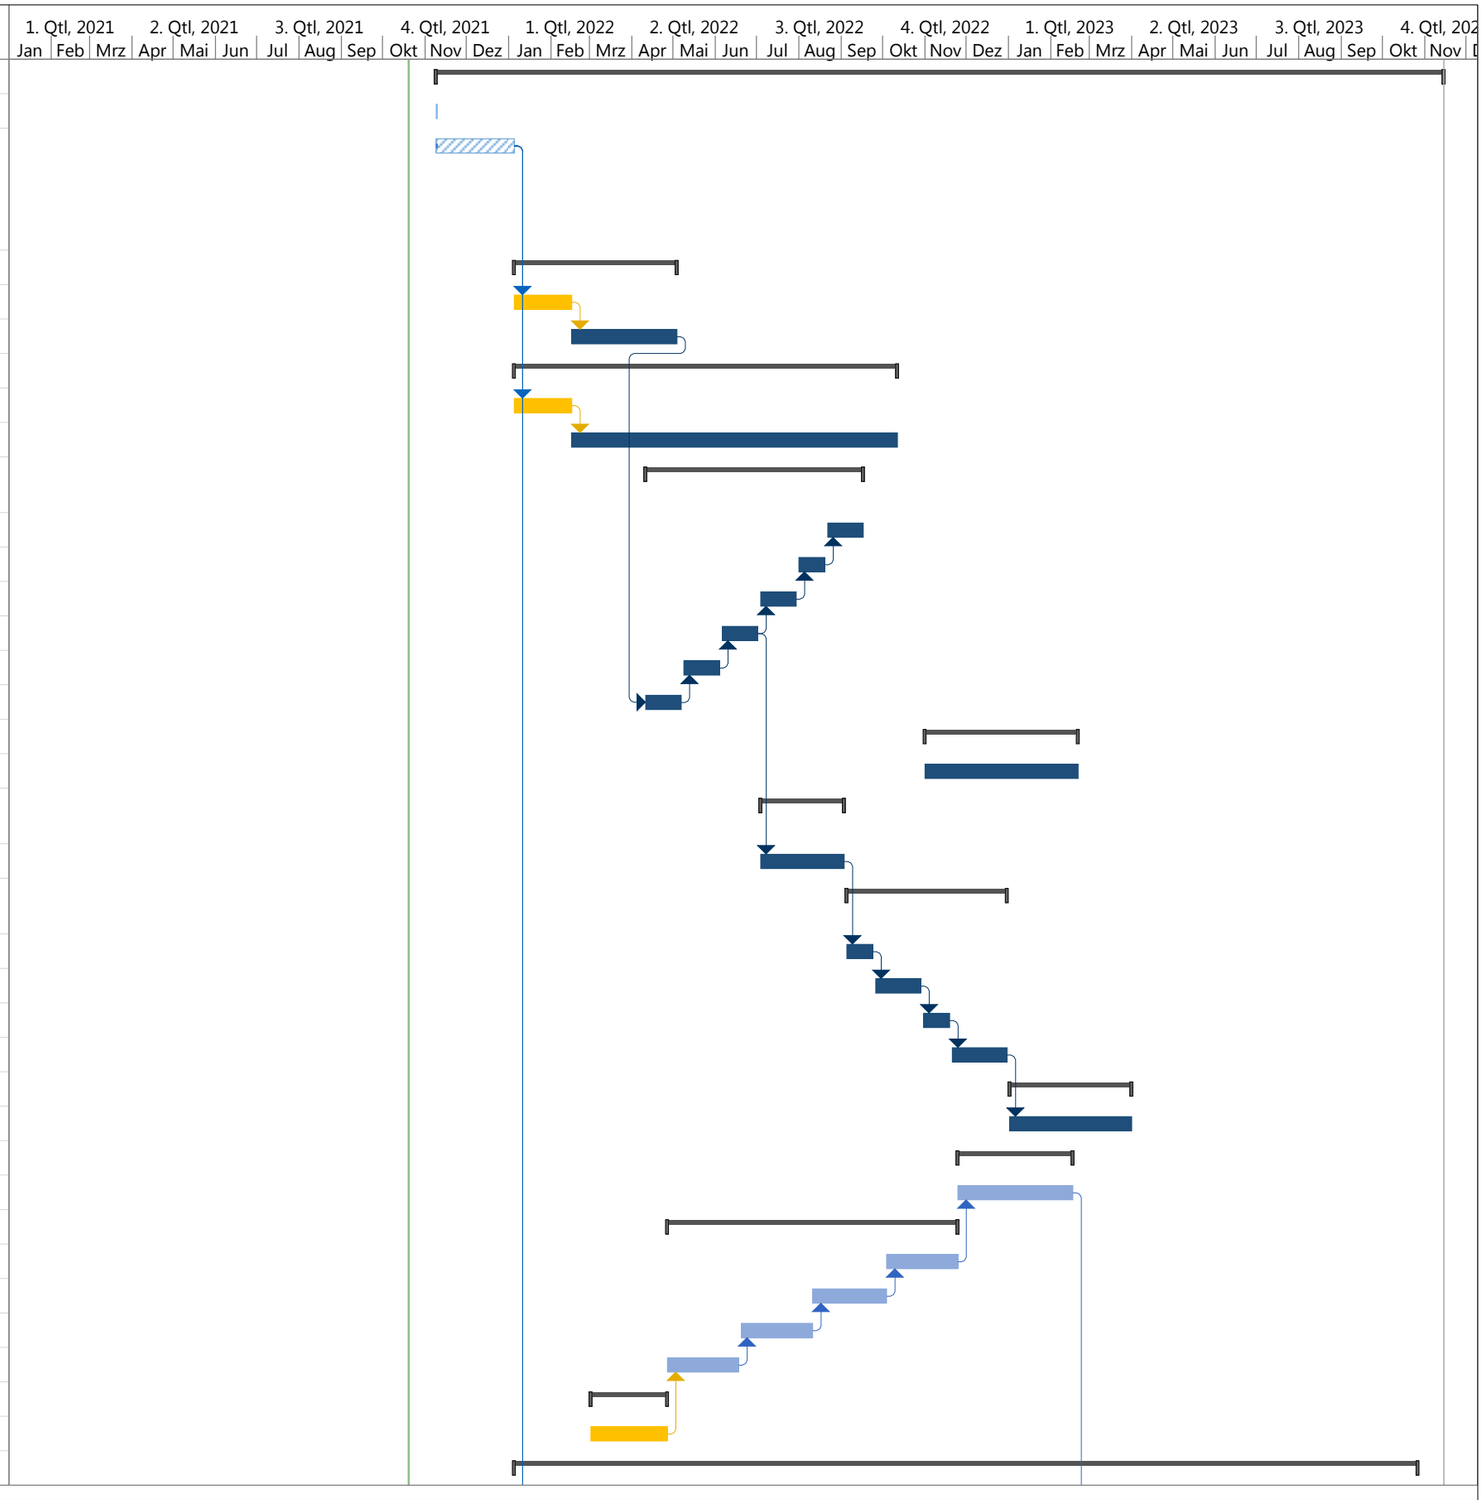

Projekt: Wesernetz - Fernwärme
Bauablaufplanung Los 1 bis Los 4
Datum: 20.10.2021

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein	

Deckblatt

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger
38	U11.1	Fre 17.02.23	Don 16.03.23	20 Tage	29
39	U11.2	Fre 17.03.23	Don 25.05.23	50 Tage	38
40	U11.3	Fre 12.05.23	Don 22.06.23	30 Tage	39EA-10 Tage
41	U11.4	Fre 23.06.23	Don 17.08.23	40 Tage	40
42	U11.5	Fre 18.08.23	Don 14.09.23	20 Tage	41
43	U11.6	Fre 15.09.23	Don 26.10.23	30 Tage	42
44	U11.7	Mit 01.03.23	Die 11.04.23	30 Tage	45
45	U11.8	Mit 01.02.23	Die 28.02.23	20 Tage	46
46	U11.9	Mit 12.10.22	Die 31.01.23	80 Tage	47
47	U11.10	Mit 03.08.22	Die 11.10.22	50 Tage	48
48	U11.11	Mit 11.05.22	Die 02.08.22	60 Tage	49
49	U11.12	Mit 30.03.22	Die 10.05.22	30 Tage	50
50	U11.13	Mit 05.01.22	Die 29.03.22	60 Tage	3
51	**12. Schwachhauser Ring**	**Mon 23.05.22**	**Fre 14.07.23**	**300 Tage**	
52	U12.1	Mon 23.05.22	Fre 22.07.22	45 Tage	
53	U12.2	Mon 25.07.22	Fre 14.07.23	255 Tage	52
54	**13. Kirchbachstraße**	**Mit 09.03.22**	**Die 23.05.23**	**315 Tage**	
55	U13.1	Mit 24.08.22	Die 29.11.22	70 Tage	56
56	U13.2	Mit 06.07.22	Die 23.08.22	35 Tage	58
57	U13.3	Mit 30.11.22	Die 14.02.23	55 Tage	55
58	U13.4	Mit 09.03.22	Die 05.07.22	85 Tage	62
59	U13.5	Mit 15.02.23	Die 11.04.23	40 Tage	57
60	U13.6	Mit 12.04.23	Die 23.05.23	30 Tage	59
61	**14. Kurfürstenallee**	**Mit 05.01.22**	**Die 17.10.23**	**465 Tage**	
62	U14.1	Mit 05.01.22	Die 08.03.22	45 Tage	3
63	U14.2	Mit 10.05.23	Die 17.10.23	115 Tage	60EA-10 Tage
64	U14.3	Mon 10.10.22	Fre 09.12.22	45 Tage	
65	U14.4	Mit 05.01.22	Die 19.04.22	75 Tage	3
66	U14.5	Mit 20.04.22	Die 02.08.22	75 Tage	65
67	U14.6	Mit 03.08.22	Die 03.01.23	110 Tage	66
68	**15. In der Vahr**	**Mit 04.01.23**	**Die 20.06.23**	**120 Tage**	
69	15.1	Mit 04.01.23	Die 21.03.23	55 Tage	67
70	15.2	Mit 22.03.23	Die 09.05.23	35 Tage	69
71	15.3	Mit 10.05.23	Die 20.06.23	30 Tage	70
72	**16. Richard-Boljahn-Allee**	**Mit 01.03.23**	**Die 14.11.23**	**185 Tage**	
73	U16.1	Mit 21.06.23	Die 22.08.23	45 Tage	71
74	U16.2	Mit 23.08.23	Die 14.11.23	60 Tage	73
75	U16.3	Mit 01.03.23	Die 16.05.23	55 Tage	
76	U16.4	Mit 17.05.23	Die 18.07.23	45 Tage	75
77	U16.5	Mit 19.07.23	Die 29.08.23	30 Tage	76

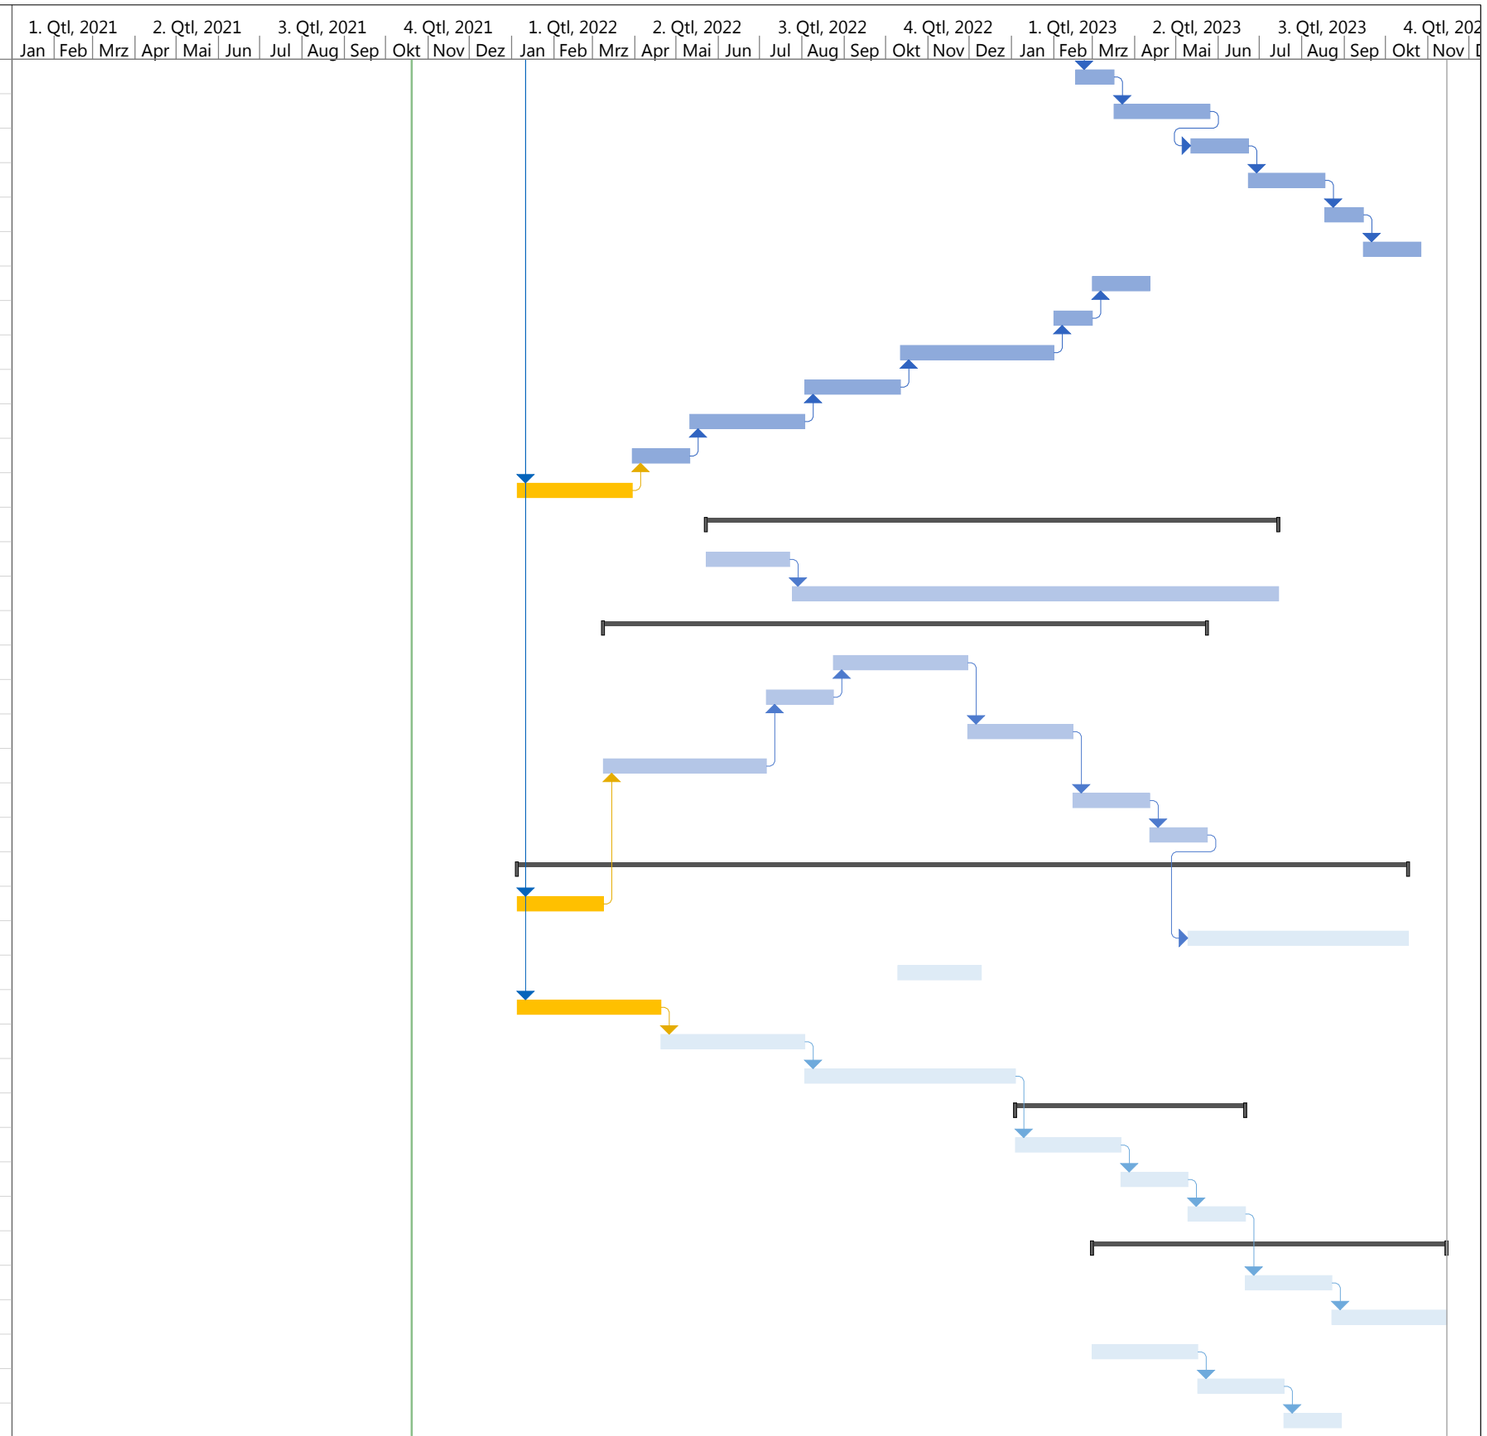

Projekt: Wesernetz - Fernwärme
Bauablaufplanung Los 1 bis Los 4
Datum: 20.10.2021

Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			

Deckblatt
