Rahmenterminplan Neubau Columbuskaje (Stand: 10.03.2021)
BA I + BA II als Gesamtmaßnahme

Kalender: 5-Tage-Woche mit Feiertagen Bremen
Rammpause (schlagende Rammung): 15. März bis 15. Juni

Druckdatum: 16.Mär.2021
Layout: CK RTP-BA1+2_AS 02_1 Option 2_Gpl

Aktivitäts-ID	Aktivitätsname	Dauer [AT]	Start	Ende
Neubau Columbuskaje (BA 1+2)_Genehmigungspl.		585	17.Mai.2021	30.Aug.2023
Bau		585	17.Mai.2021	30.Aug.2023
Vertragstermine		585	17.Mai.2021	30.Aug.2023
A-1000	Auftragsvergabe	0	17.Mai.2021*	
A-1010	Frist bis Baubeginn	12	17.Mai.2021	02.Jun.2021
A-1100	Fertigstellung Kaje (BA 1+BA 2)	0		09.Aug.2023
A-3600	Inbetriebnahme Brücke 1	0		31.Mär.2023
A-3700	Inbetriebnahme Brücke 2	0		30.Aug.2023
Vorbereitende Arbeiten		120	03.Jun.2021	17.Nov.2021
A-1300	Technische Bearbeitung	120	03.Jun.2021	17.Nov.2021
A-1400	Lieferzeit Spundwandmaterial	80	23.Jul.2021	11.Nov.2021
A-1450	Lieferzeit Schrägpfähle	40	29.Jul.2021	22.Sep.2021
A-1500	Baustelleneinrichtung	15	27.Sep.2021	15.Okt.2021
A-1600	Baggerarbeiten Nord bis auf Unterhaltungstiefe	5	25.Okt.2021	29.Okt.2021
A-1700	Abbruch / Rückbau Nordseite (Kaje 66) für Pfahlbock im Best	10	18.Okt.2021	29.Okt.2021
Rammarbeiten		319	01.Nov.2021	30.Jan.2023
A-1800	Einbringen Schrägpfähle für Pfahlbock Bestand (BA1)	6	01.Nov.2021	08.Nov.2021
A-1900	Einbringen Tragbohlen (BA1)	42	12.Nov.2021	10.Jan.2022
A-2300	Einbringen Schrägpfähle (BA1)	50	11.Jan.2022	22.Jun.2022
A-2400	Einbringen Füllbohlen (BA1)	28	23.Jun.2022	01.Aug.2022
A-2500	Herstellen Abschlusswand und Anschluss Bestand (BA1)	3	02.Aug.2022	04.Aug.2022
A-3300	Einbringen Tragbohlen (BA2)	23	20.Okt.2022*	22.Nov.2022
A-5600	Einbringen Schrägpfähle (BA2)	30	23.Nov.2022	04.Jan.2023
A-5700	Einbringen Füllbohlen (BA2)	15	05.Jan.2023	25.Jan.2023
A-5800	Herstellen Abschlusswand und Anschluss Bestand (BA2)	3	26.Jan.2023	30.Jan.2023
Stahlbau		304	19.Nov.2021	27.Jan.2023
A-1950	Vorbereitende Arbeiten Stahlbauanschlüsse Rundstahlanker (I	10	19.Nov.2021	02.Dez.2021
A-2000	Einbauen und Anschluss Rundstahlanker Nord (BA1)	5	03.Dez.2021	09.Dez.2021
A-2600	Vorbereitende Arbeiten Stahlbauanschluss Schrägpfähle (BA1	50	03.Dez.2021	10.Feb.2022
A-2700	Stahlbauanschluss Schrägpfähle (BA1)	50	11.Feb.2022	25.Jul.2022
A-5900	Vorbereitende Arbeiten Stahlbauanschluss Schrägpfähle (BA2	30	04.Nov.2022	15.Dez.2022
A-6000	Stahlbauanschluss Schrägpfähle (BA2)	30	16.Dez.2022	27.Jan.2023
Verfüllung und Erdarbeiten		156	29.Jul.2022	08.Mär.2023
A-2200	Teilverfüllung Baugrube Nord im Bereich des Betonholmes Pfa	5	29.Jul.2022	04.Aug.2022
A-2800	Verfüllung / Sandaufspülung (24/7-Spülbetrieb) in [AT] (BA1)	40	05.Aug.2022	29.Sep.2022
A-2810	Verfüllung/ Sandaufspülung (24/7-Spülbetrieb) in [AT] (BA2)	22	31.Jan.2023	01.Mär.2023
A-3000	Herstellen Böschung Süd	5	02.Mär.2023	08.Mär.2023
Betonarbeiten		398	09.Nov.2021	05.Jun.2023
A-2100	Herstellen Betonholm für Pfahlbock Bestand	18	09.Nov.2021	02.Dez.2021
A-2900	Herstellen Betonholm (18 Blöcke à 21,58 m) inkl. Poller (BA1)	103	30.Sep.2022	24.Feb.2023
A-3100	Herstellen Betonholm (10 Blöcke a 21,58 m) inkl. Poller (BA2)	63	02.Mär.2023	05.Jun.2023
Oberflächenarbeiten und Restarbeiten		176	29.Nov.2022	09.Aug.2023
A-3200	Oberflächenbefestigung / Entwässerung (BA1)	75	29.Nov.2022	14.Mär.2023
A-3210	Oberflächenbefestigung/ Entwässerung (BA2)	40	02.Mai.2023	28.Jun.2023
A-3220	Nautische Ausrüstung (BA1)	15	20.Feb.2023	10.Mär.2023
A-3230	Nautische Ausrüstung (BA2)	10	06.Jun.2023	19.Jun.2023
A-3320	Restarbeiten	20	29.Jun.2023	26.Jul.2023
A-3400	Baustellenräumung	10	27.Jul.2023	09.Aug.2023
Maschinenbau Passagierbrücken		168	02.Jan.2023	30.Aug.2023
A-3500	Installation Passagierbrücke 1	65	02.Jan.2023	31.Mär.2023
A-3800	Installation Passagierbrücke 2	65	01.Jun.2023	30.Aug.2023

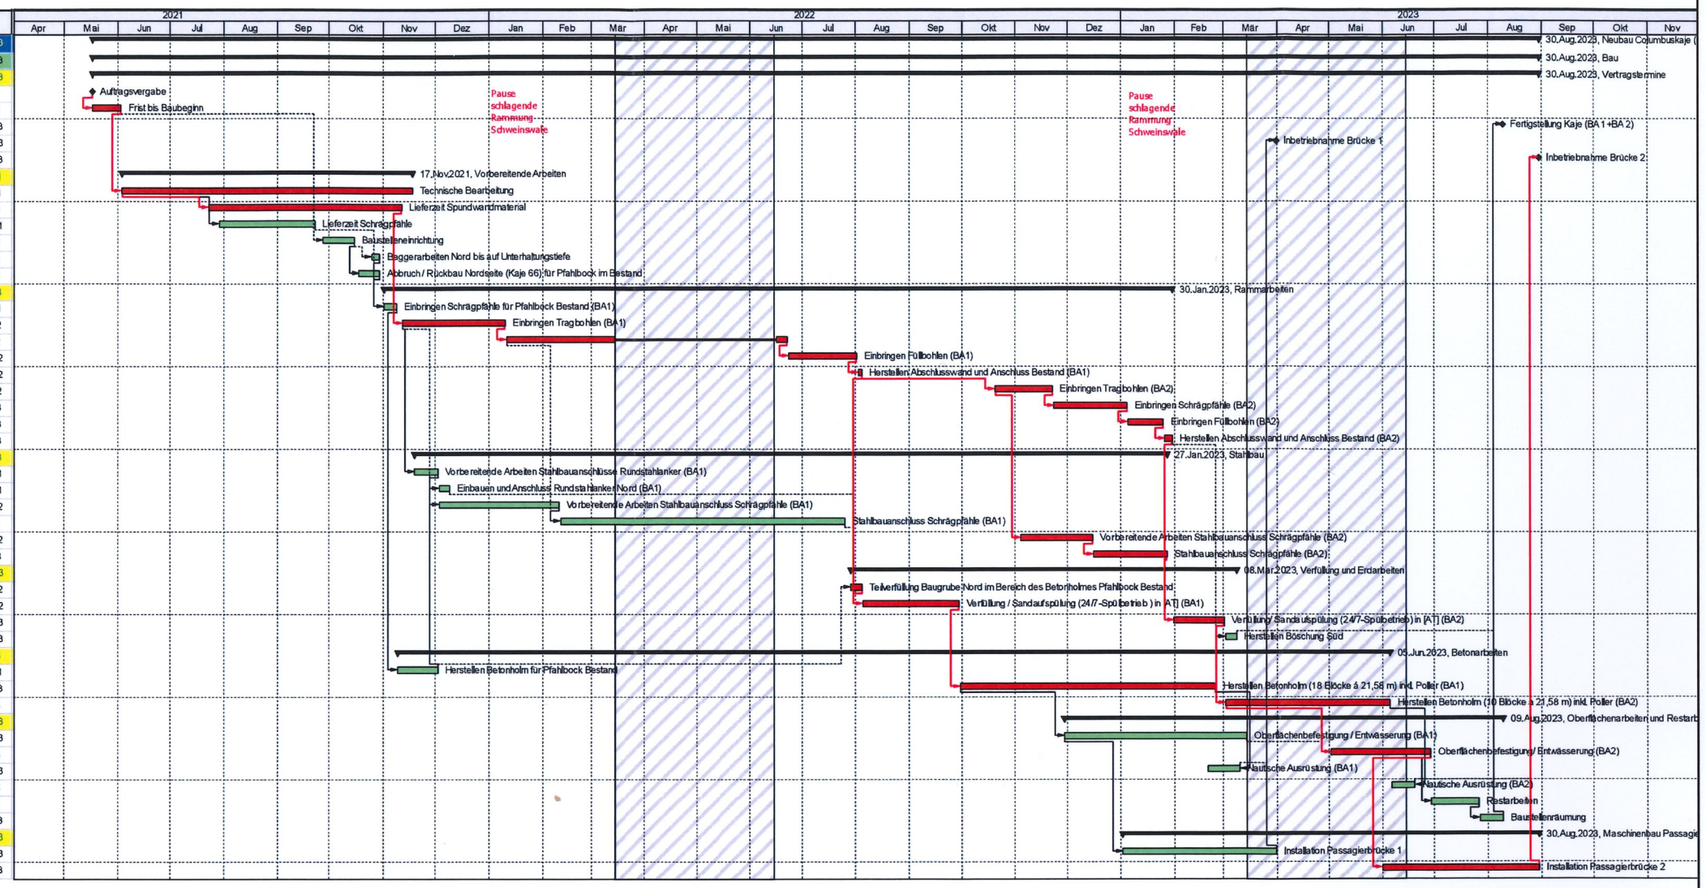

Sperrzeit schlagende Rammung
Verbleibende Arbeit
Kritische verbleibende Arbeit
Kritische verbleibende Arbeit
Meilenstein
Übersicht

bremenports
